



H18年度施設設備の実績 - 1

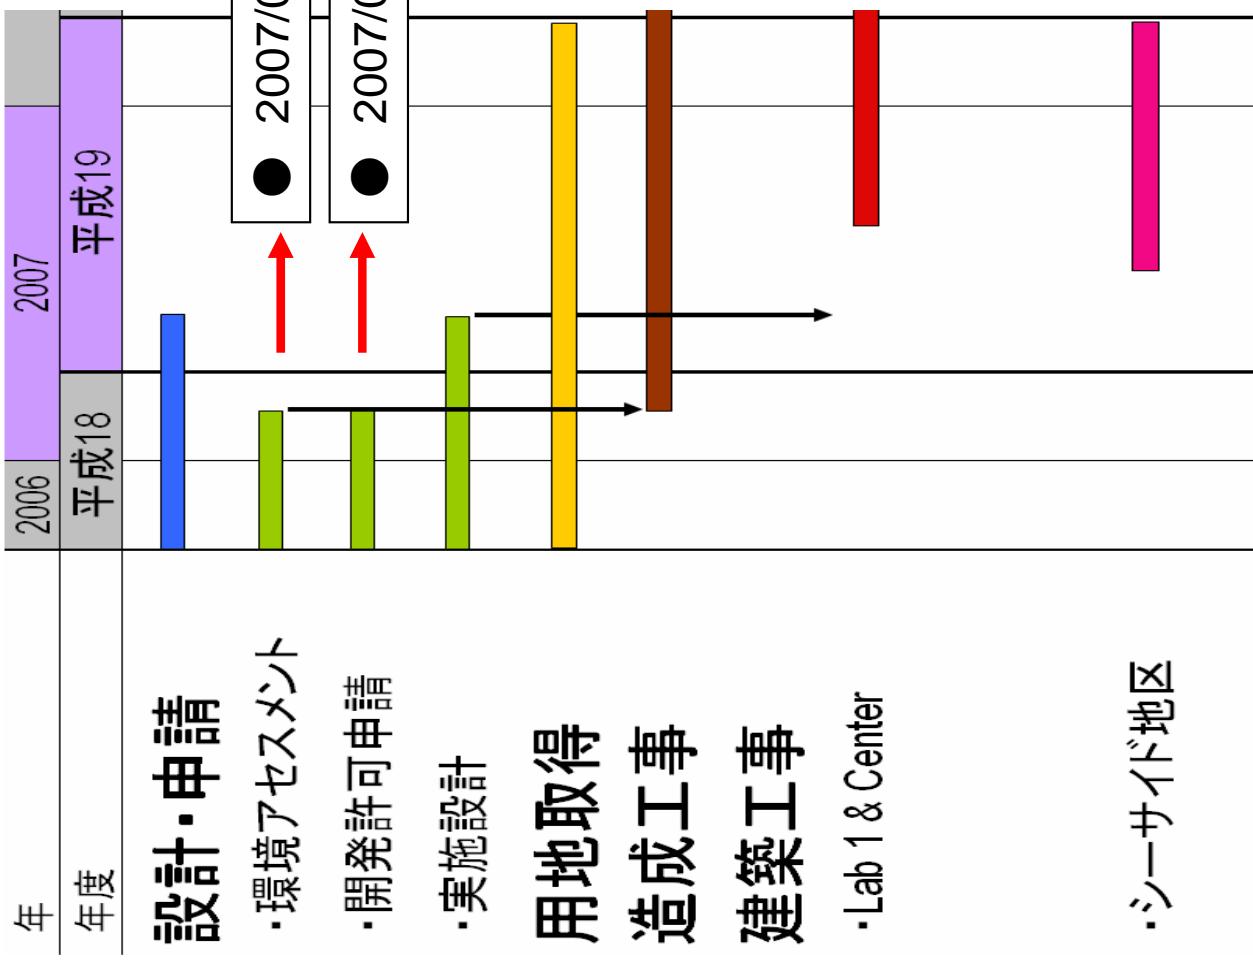

H18年度施設設備の実績 - 2

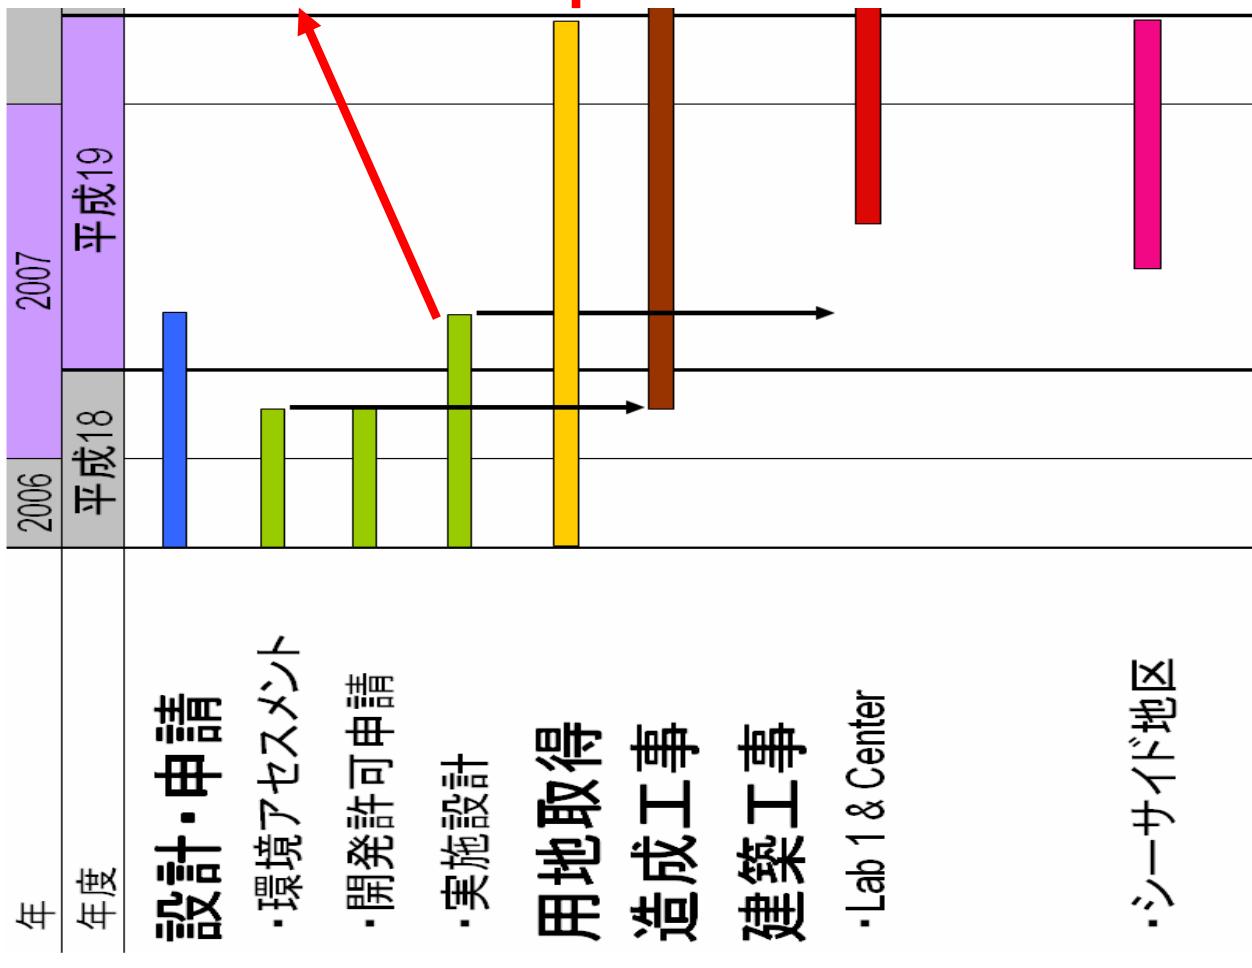

・環境アセスメント

・開発許可申請

・実施設計

用地取得

造成工事

建築工事

・Lab 1 & Center

・シーサイド地区



- 2007/02/19: CPG実施設計最終確認

2007/04/03: 建築確認申請提出

- ヴィレッジジーン: H18年度末までに95%完了

- ヒルサイドジーン: H18年度末までに69%完了

メイバンキャンノバス民有地取得状況

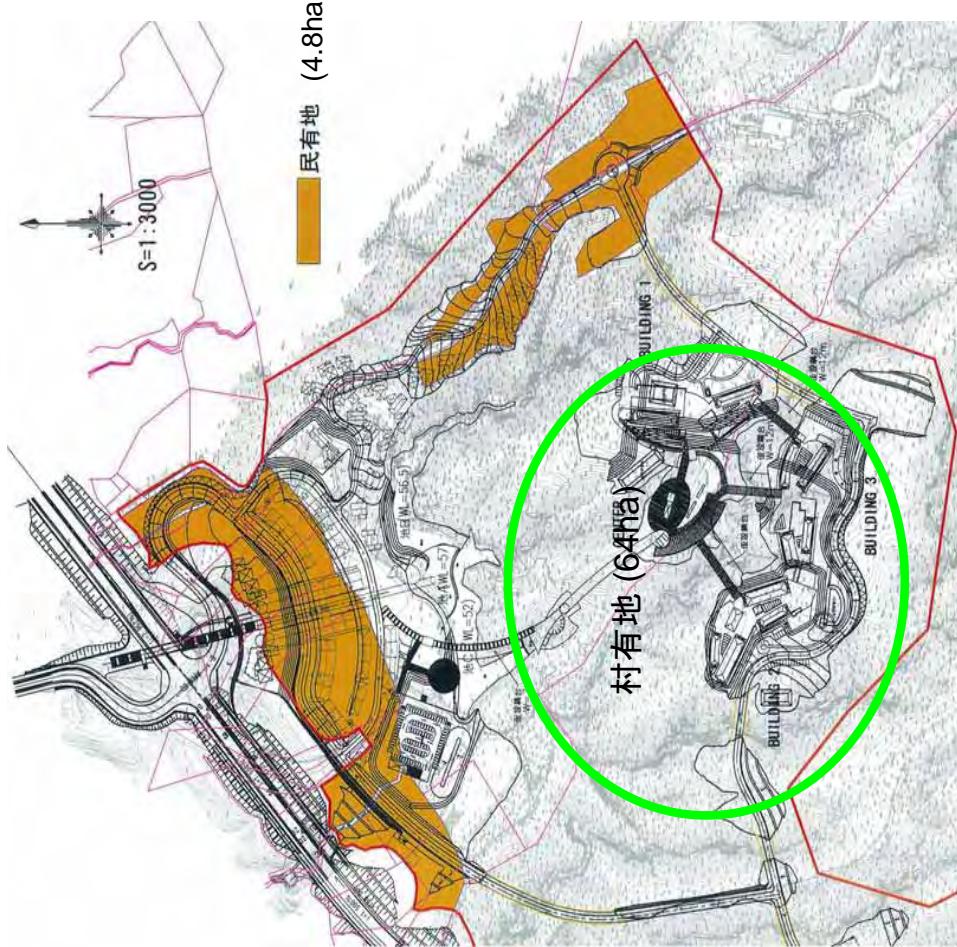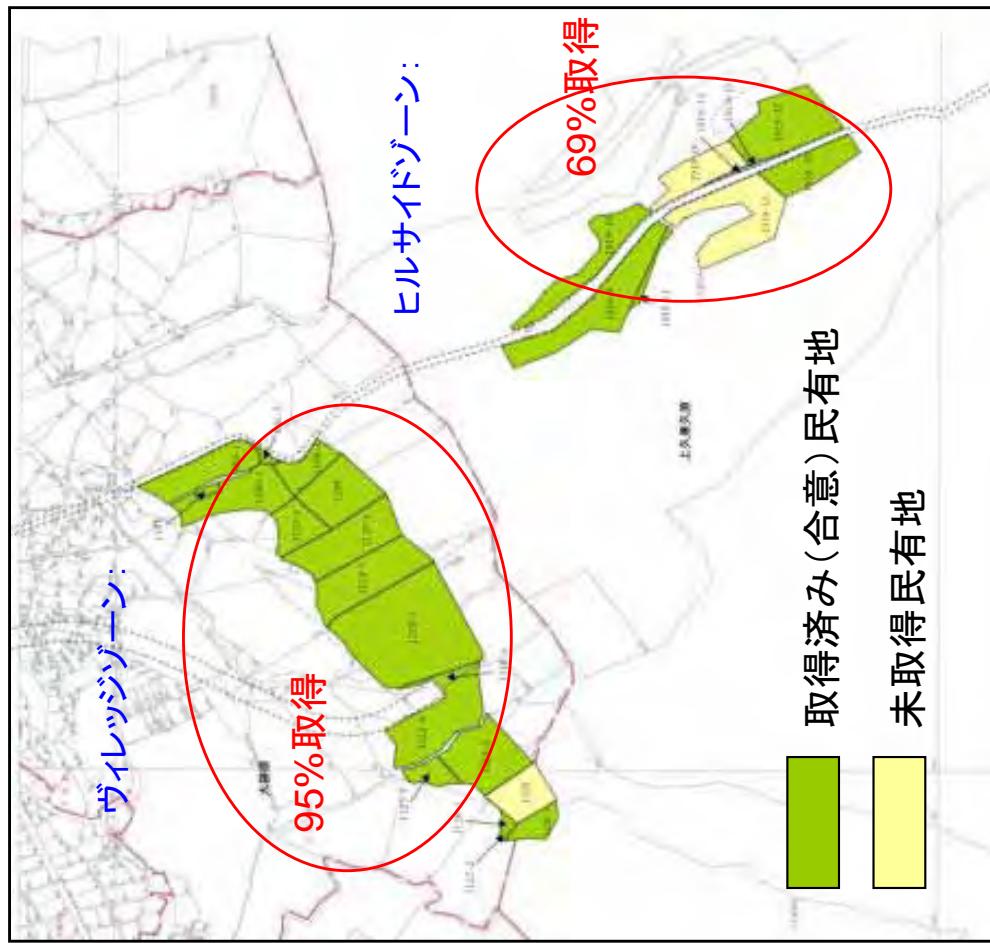

造成工事年度計画

H18年度末、造成工事の着手により、H19年度下期の建築工事着手が可能になりました。

